Zakład Usług Kominiarskich i Wysokościowych
„KIER" Piotr Kierszka
Szczecin ul. Monterska 1/16 71-835
tel. 609-04-99-88 nip 8522507570

Szczecin dnia....24-06-...~~2025~~ 2026.....r

OPINIA NR...P/09/06/25....
.....Projektowa.....

KIER Piotr Kierszka
ul. Monterska 1/16, 71-835 Szczecin
NIP 852-250-75-70

Z wyników przeprowadzonych oględzin-ekspertyzy urządzeń grzewczo -kominowych w.....SZCZECIN.....ul.....MONTE CASSINO .....nr..3.....
dotycząca mieszkania/łokalu ..9... Pan/Pani .....STBS.....
sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia Mistrza Kominiarskiego Pana Piotr Kierszka w celu :

1.~~Wskazania miejsca podłączenia.~~
2.Ustalenia prawidłowości podłączenia.
~~3.Ustalenie przyczyny wadliwego działania urządzeń.~~

W związku z czym stwierdzono co następuje :
1. Przewód(y) Nr 1,2..(patrz szkic na odwrocie) odpowiadają* ~~nie odpowiadają~~* wymaganiom niżej wymienionych przepisów i może(mogą)* ~~nie może(nie mogą)~~* być przeznaczony(e) do podłączenia:.....
.....Nr 1 – CO GAZOWE kuchnia m9 (WYBUDOWAĆ) .....
.....
.....Nr 2 – Wentylacja kuchni m9..(WYBUDOWAĆ).....

2. Celem osiągnięcia prawidłowego funkcjonowania należy : - zapewnić stały dopływ powietrza , wykonać łącznik o przekroju 150mm z stali ocynkowanej. ZAPROJEKTOWAĆ I WYBUDOWAĆ PRZEWODY NR 1, 2
.....
.....

..... Po wykonaniu zgłosić do rekontroli.*
3. Urządzenie(a) ~~podłączono~~ ..... ~~prawidłowo~~ ~~nie prawidłowo~~*
.....
Rekontrola dnia. .....
.....
.....
....
.....


Opinie sporządzono w oparciu o: Ustawę o Prawie Budowlanym z dnia 07.07.1994.Dz. U. Nr 89, poz. 414, art. 7, ust. 2, pkt. 1 z dnia 25.08.1994r. Z późniejszymi zmianami. Przepisy wykonawcze Dz. U. Nr. 92 poz. 460 oraz wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze z Rozp. M.S.W.i.A. Z dnia 16.06.2003r. Dz. U. Nr. 121 poz. 1138' oraz wydane przepisy szczegółowe i obowiązujące normy przedmiotowe.

Opinia ważna 6 miesięcy. Wydana na podstawie podłączeń z dnia kontroli !!!
Potwierdzenie odbioru opini :
Dnia..... podpis.....

Kontrolujący :
Mistrz kominiarski
Piotr Kierszka
nr upr.670
KIER Piotr Kierszka ul. Monterska 1/16, 71-835 Szczecin NIP 852-250-75-70
.....
podpis.

*niepotrzebne skreślić

MONTE CASSINO 3/9

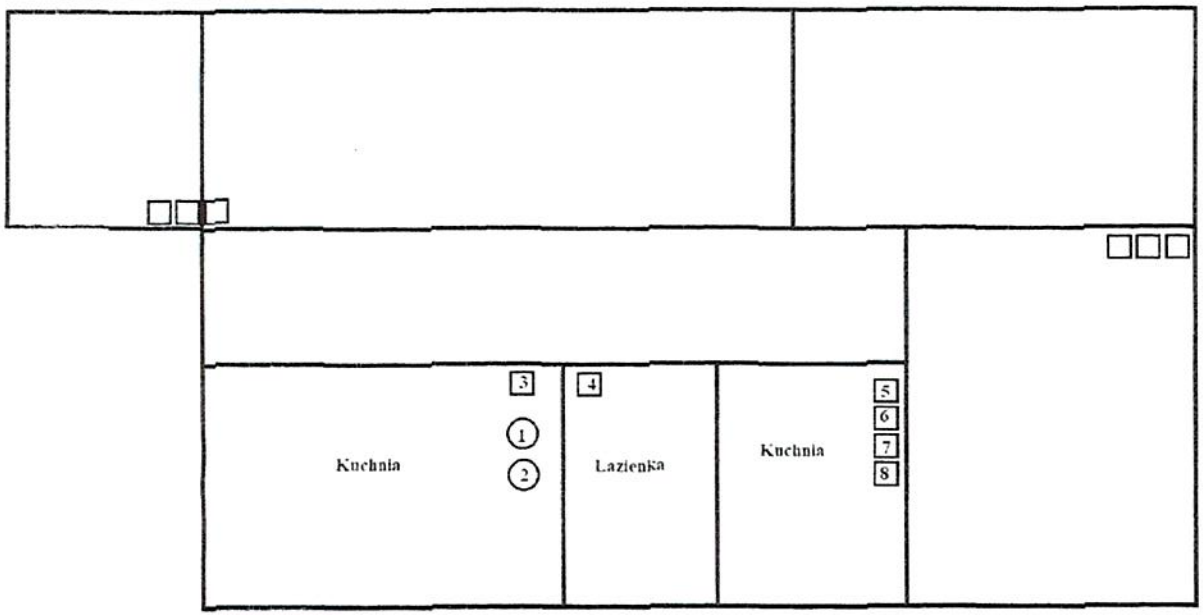

Opis podłaczeń:

1- Tu co gazowe (zaprojektować i wybudować)
2- Tu wentylacja pomieszczenia kotła Co gazowego(zaprojektować i wybudować
3- obecna wentylacja kuchni I (pion wspólny)
4- Obecna wentylacja łazienki (pion wspólny)
5- zajęty
6- wkład- zajęty
7- zajęty
8- Obecna wentylacja kuchni II (pion wspólny)

Brak wolnych przewodów w obrębie lokalu. Zaleca się zaprojektowanie dwóch przewodów wentylacyjnego i spalinowego a następnie budowę.
Wskazano superowane miejsce instalacji przewodów.

KIER Piotr Kierszka
ul. Monteiska 1/16, 71-835 Szczecin
NIP 852-250-75-70
